

Vorstellung im Schulträgerausschuss 10.02.2021

Kostensituation:

Haushaltsansatz:	8.765.884 €
Stand Beauftragung:	539.481 €
Stand Abrechnung:	181.258 €

Stand Bauarbeiten:

Die Baugenehmigung ist im November 2020 eingegangen. Mit Zusendung des Förderbescheides wird noch im Januar 2021 gerechnet.

Es ist beabsichtigt mit den Bautätigkeiten in den Sommerferien 2021 zu beginnen. Um dieses Ziel erreichen zu können, wurde die vorhanden Bäume auf dem Baufeld bereits gerodet.

Termin der Fertigstellung:

Nach jetzigem Planungstand ist mit Fertigstellung der Maßnahme im Sommer 2023 zu rechnen, sodass das Gebäude nach den Sommerferien 2023 in Betrieb genommen werden kann.



Abbildung 1: Ansicht Nord

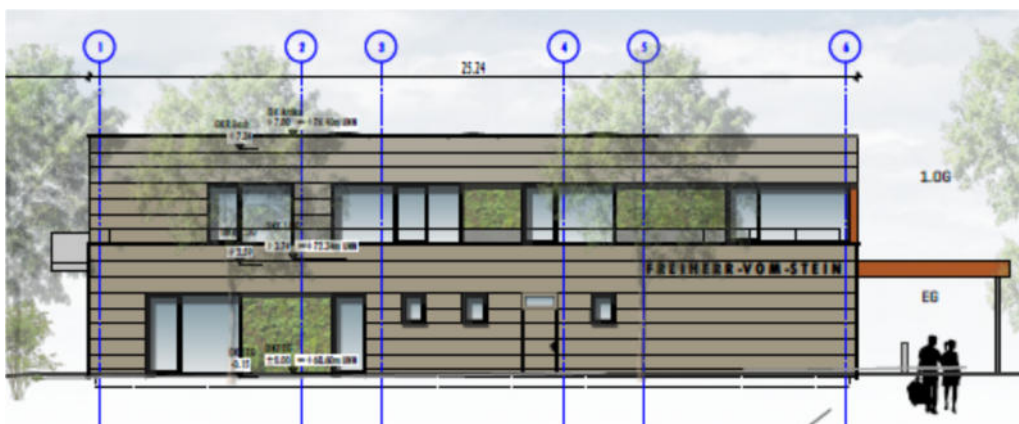


Abbildung 2: Ansicht Ost

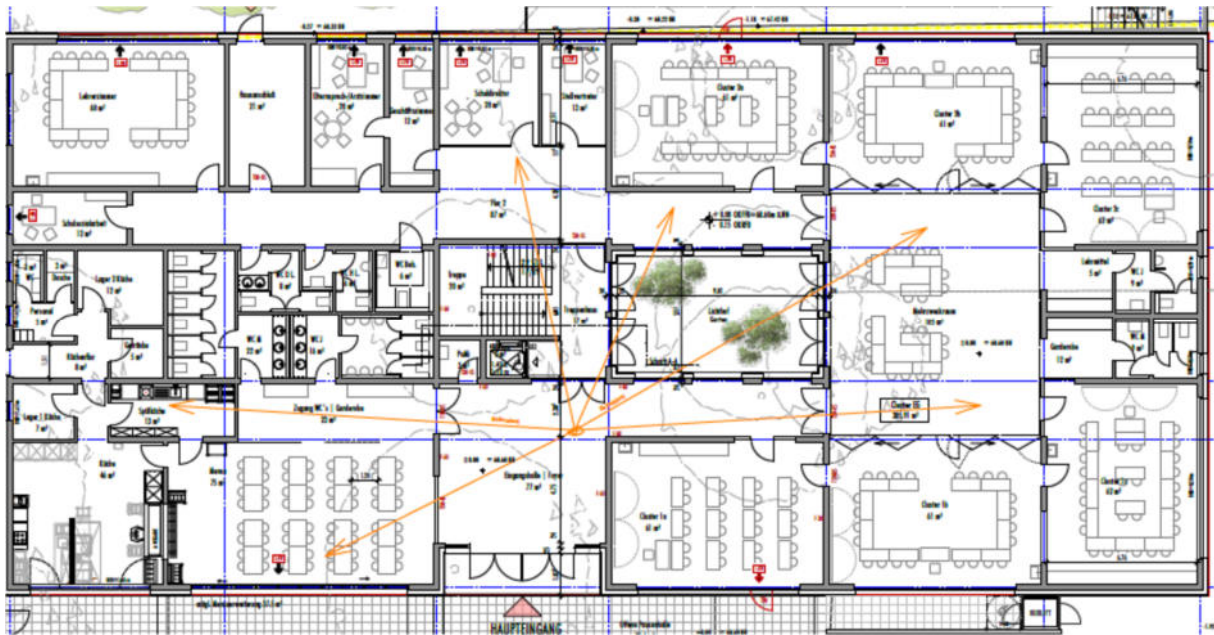


Abbildung 3: Grundriss EG

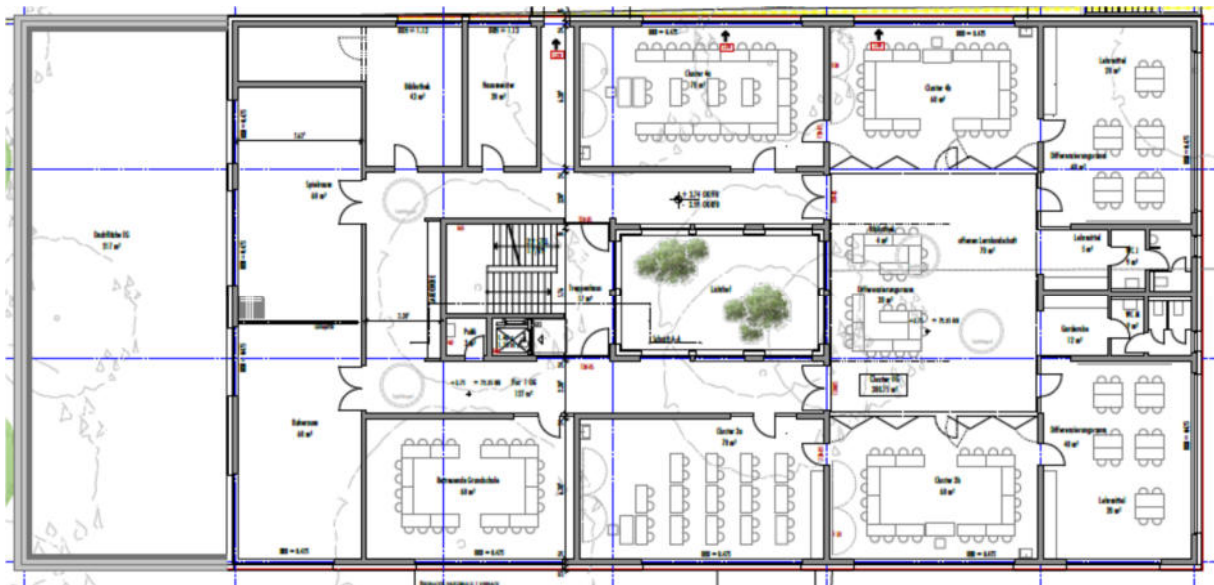


Abbildung 4: Grundriss OG

Aufgestellt:

15.01.2021 ZGM
