

Vorstellung im Schulträgerausschuss 10.02.2021

**Kostensituation (brutto):**

Gesamtkosten Haushalt:	439.650,00 €
Stand Beauftragung Jan 2021:	610.291,15 €
Stand Abrechnung Jan 2021:	542.014,68 €

**Stand Bauarbeiten:**


Die Umbauarbeiten sind vollständig abgeschlossen, aktuell stehen noch kleine Restarbeiten an, die die Nutzung nicht wesentlich beeinträchtigen. Die Schule kann die Räumlichkeiten seit der Einweisung am 24.11.2020 nutzen.

**Zur Kostenüberschreitung:**




Anstelle der geplanten zwei Unterrichtsräumen U06 und U11 und einem Vorbereitungsraum U04 mussten aufgrund der Infrastruktur (Lüftungs-, Wasser- und Elektroleitungen, sowie den Abhang-Decken) auch die Sammlung U05 und der NAWI-Raum U02 umgebaut werden.

**Termin der Fertigstellung:**

Die Restarbeiten werden Ende Januar abgeschlossen sein.

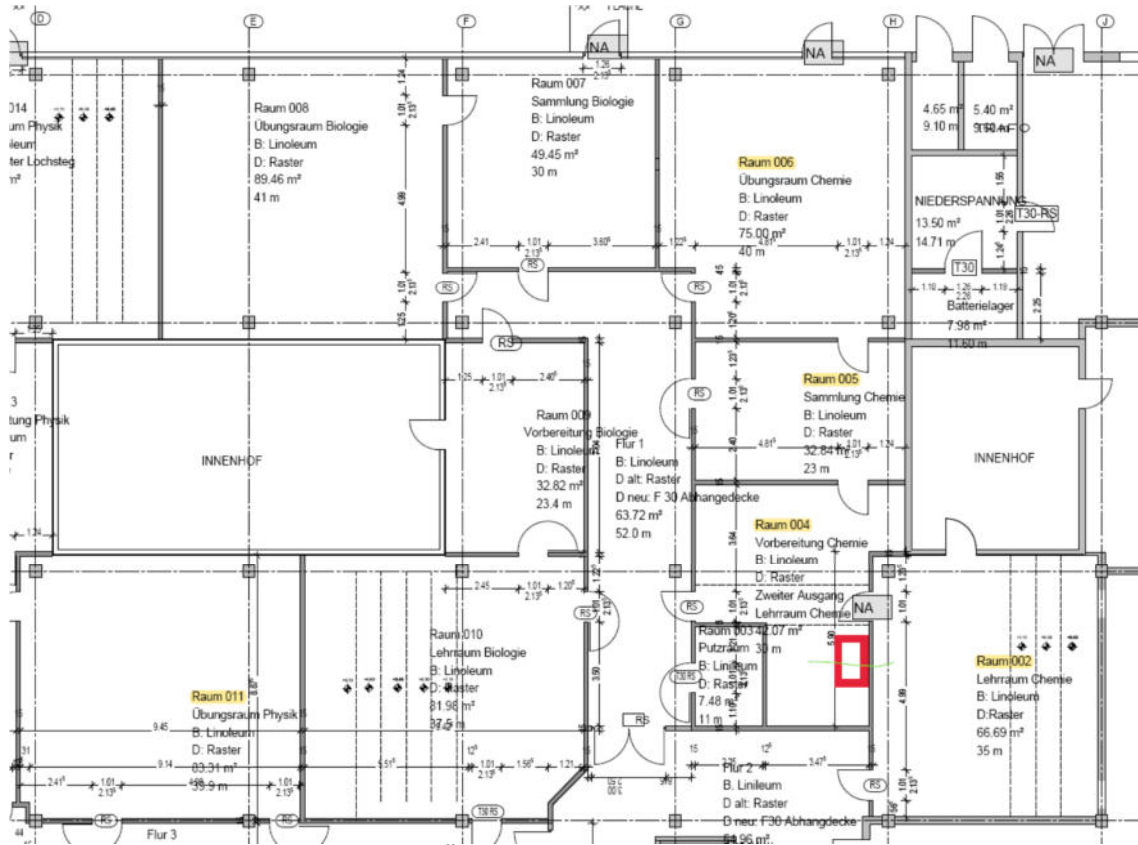

Übersichtsplan 02.12.2019

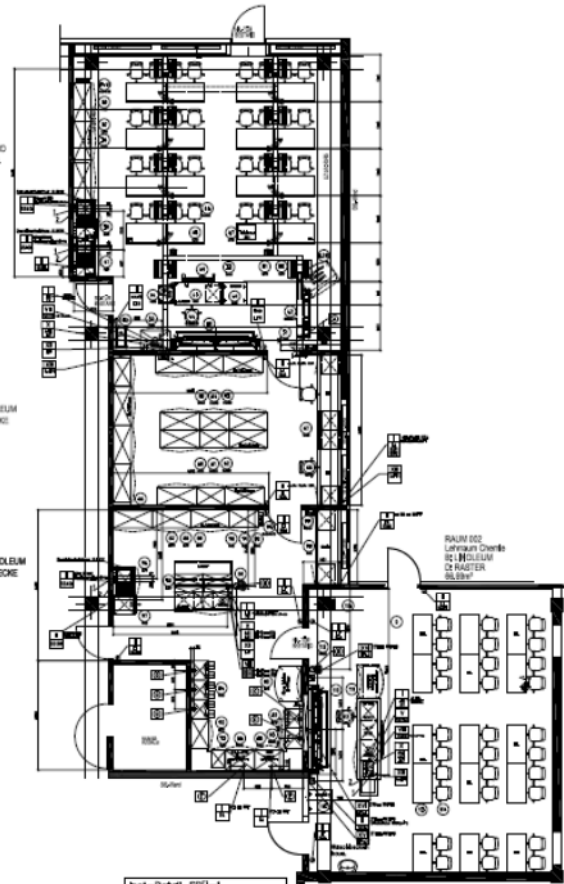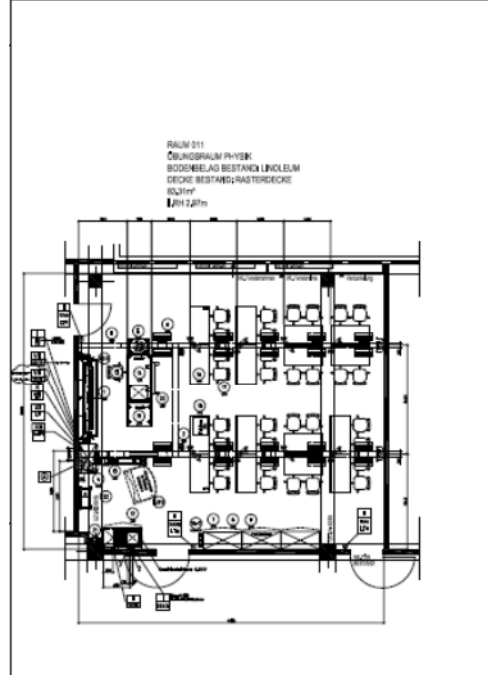



NAWI-Raum 011 am 26.09.2019 vor der Sanierung



NAWI-Raum 011 am 23.10.2020

Aufgestellt:

25.01.2021 ZGM
