

Vorstellung im Schulträgerausschuss

Kostensituation:

Gesamtkosten Haushalt:	5.278.00,00 €
Haushaltsansatz 2023:	500.000,00 €
Stand Beauftragung Sept. 23:	00 €
Stand Abrechnung Sept. 23:	00 €


Stand Bauarbeiten/Vergaben:

Maßnahme wartet auf Förderbescheid.

Im Zuge der Prüfungen des Ingenieurbüros TGA und dem TÜV wurden an der bestehenden Lüftungsanlage der Sporthalle und Mensa immer wieder gravierende Mängel festgestellt. Um diese Mängel abzustellen ist es unausweichlich neue Lüftungsanlagen für diese Bereiche einzubauen.

Im Zuge dieser neuen Lüftungseinbauten müssen die bestehenden Abhangdecken in der Sporthalle und Mensa erneuert werden, da diese bei der Sanierung der Lüftung nicht erhalten werden können und zukünftig in der Sporthalle eine Deckenstrahlheizung eingebaut werden soll. Im Zuge der Deckensanierung ist außerdem geplant die vorhandenen Lichtbänder der Sporthalle zu tauschen und die im Brandschutzkonzept geforderten und bisher nicht vorhandenen Rauch- und Wärmeabzugsanlagen (RWA) nachzurüsten. Die fehlenden RWA's stellen einen ganz massiven Mangel dar, welcher dringend behoben werden muss.

Um die vorbeschriebenen Maßnahmen umsetzen zu können, wurde ein entsprechender Förderantrag im Jahr 2022 bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) eingereicht. Dazu wurden zwischenzeitlich zusätzliche Planungen und Ermittlungen nachgefordert, die aktuell zusammengestellt werden.

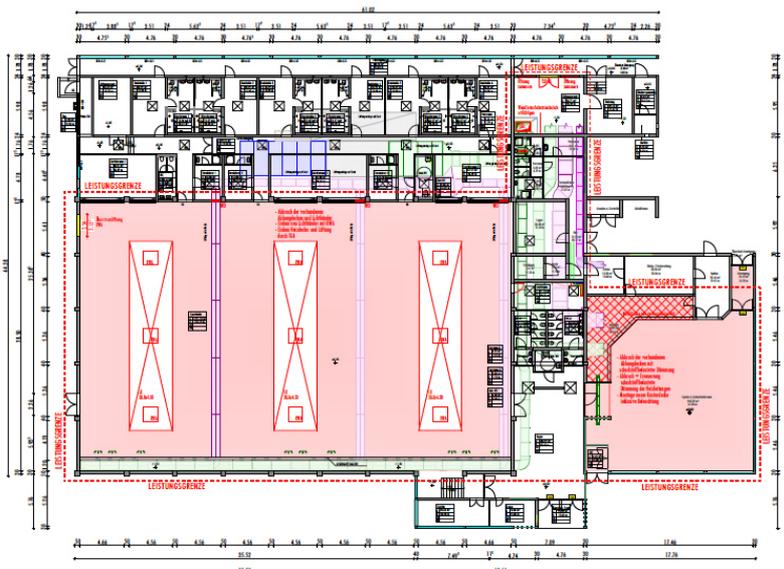

Termin der Fertigstellung: in Abhängigkeit von Erteilung Förderbescheid

Aufgestellt: 12.09.2023, ZGM
