

Vorstellung im Schulträgerausschuss

Kostensituation (brutto):

Gesamtkosten Haushalt:	2.793.000,00 €
Haushaltsansatz 2023:	240.000,00 €
Stand Beauftragung Sept. 2023:	496.935,91 €
Stand Abrechnung Sept.2023:	344.220,80 €

Stand Bearbeitung:

Die Baugenehmigung liegt vor. Auf Grund der aufwendigen Tiefbauarbeiten, ist der Rückbau und der anschließende Neubau des Bestandsgebäudes wirtschaftlicher. Dies Vorgehensweise wird nun verfolgt. Zurzeit werden die Leistungsverzeichnisse durch die beauftragten Planungsbüros erstellt. Die Vergaben der Erd- und Rohbauarbeiten, der Abbrucharbeiten und der HLSE-Gewerke soll noch in diesem Jahr erfolgen.

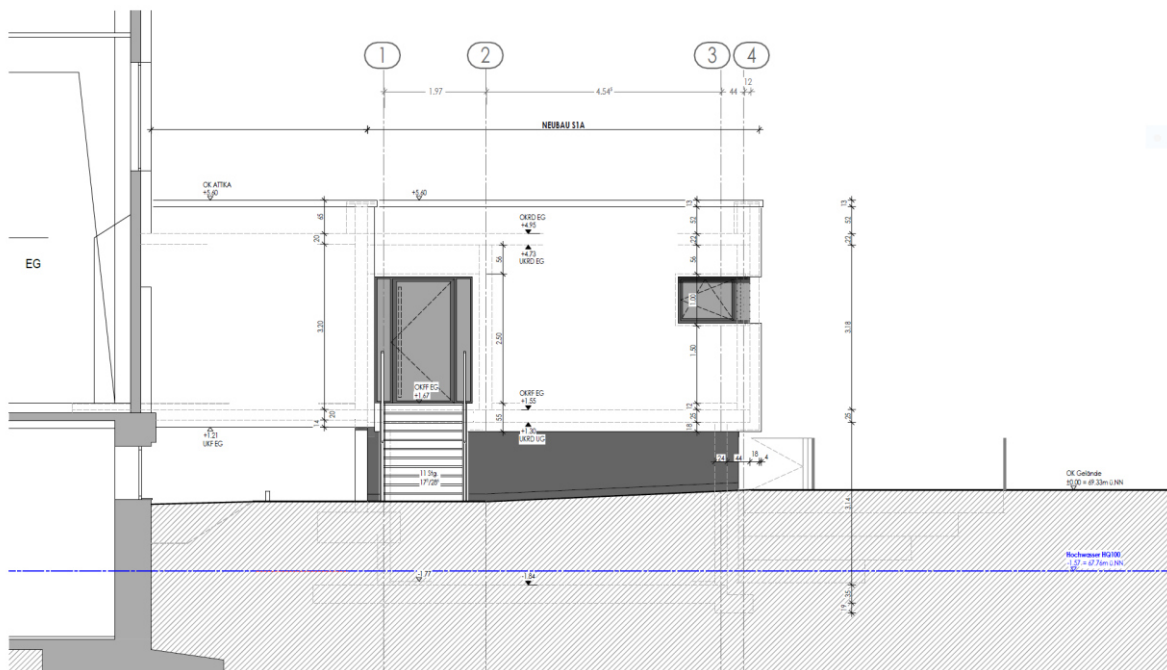


Abbildung 1 Ansicht Süd-West



Abbildung 2 Ansicht Süd-Ost

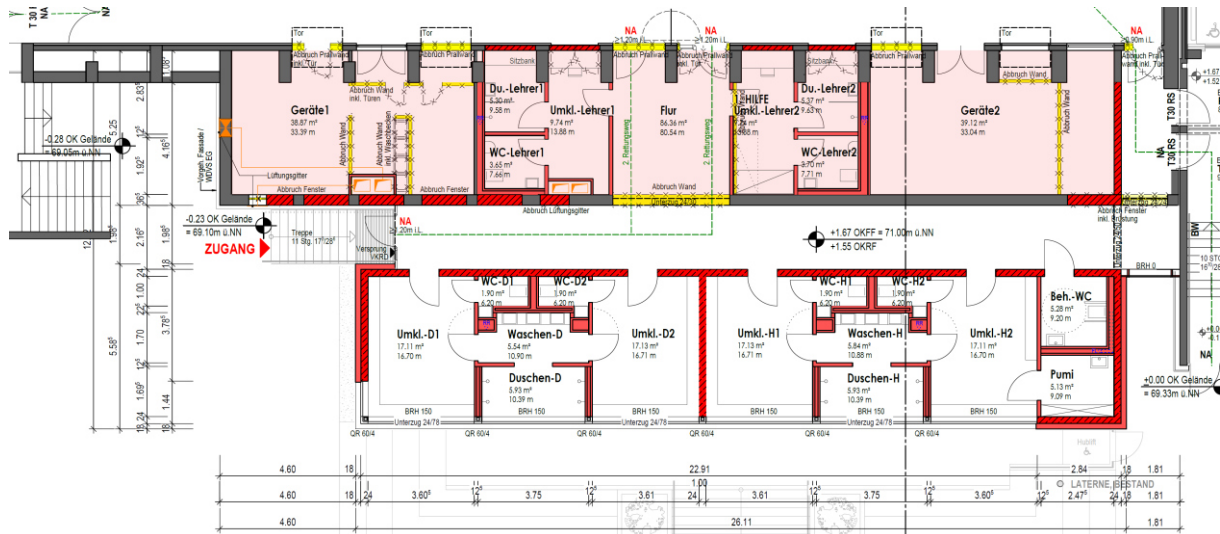


Abbildung 3 Grundriss EG

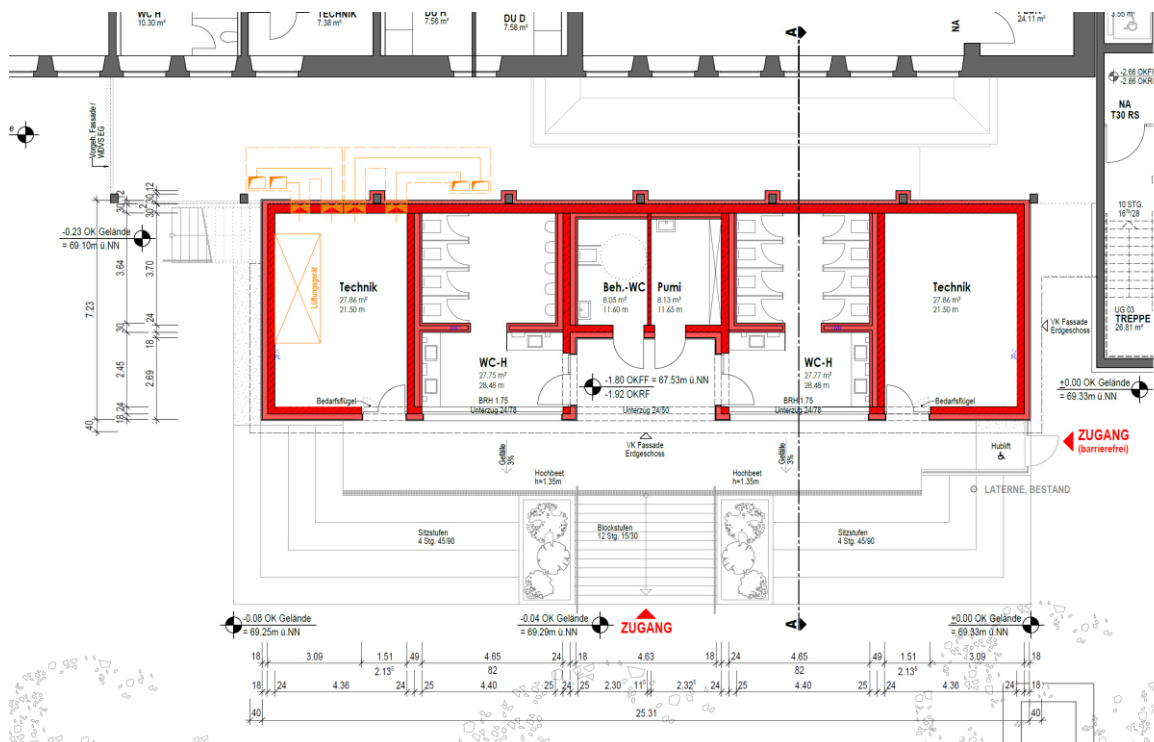


Abbildung 4 Grundriss UG

Termin der Fertigstellung:

Sommer 2025

Aufgestellt:

18.09.2023 ZGM
