

Vorstellung im Schulträgerausschuss 21.09.2023

Kostensituation:

Gesamtkosten Haushalt:	721.000,00 €
Haushaltsansatz:	00 €
Stand Beauftragung:	774.122,03 €
Stand Abrechnung:	590.292,68 €

Stand Bauarbeiten/Vergaben:

Maßnahme ist abgeschlossen. Presseinfo wird zurzeit fertiggestellt und dann verteilt.
Die Schule ist sehr zufrieden mit dem Ergebnis.

Termin der Fertigstellung:

Die Maßnahme ist abgeschlossen. Die Entwicklungspflege der Bepflanzung wird noch über zwei Jahre von der Landschaftsbaufirma fortgeführt.



Abbildung 1 rege Nutzung der neuen Sport- Spiel- und Aufenthaltsflächen

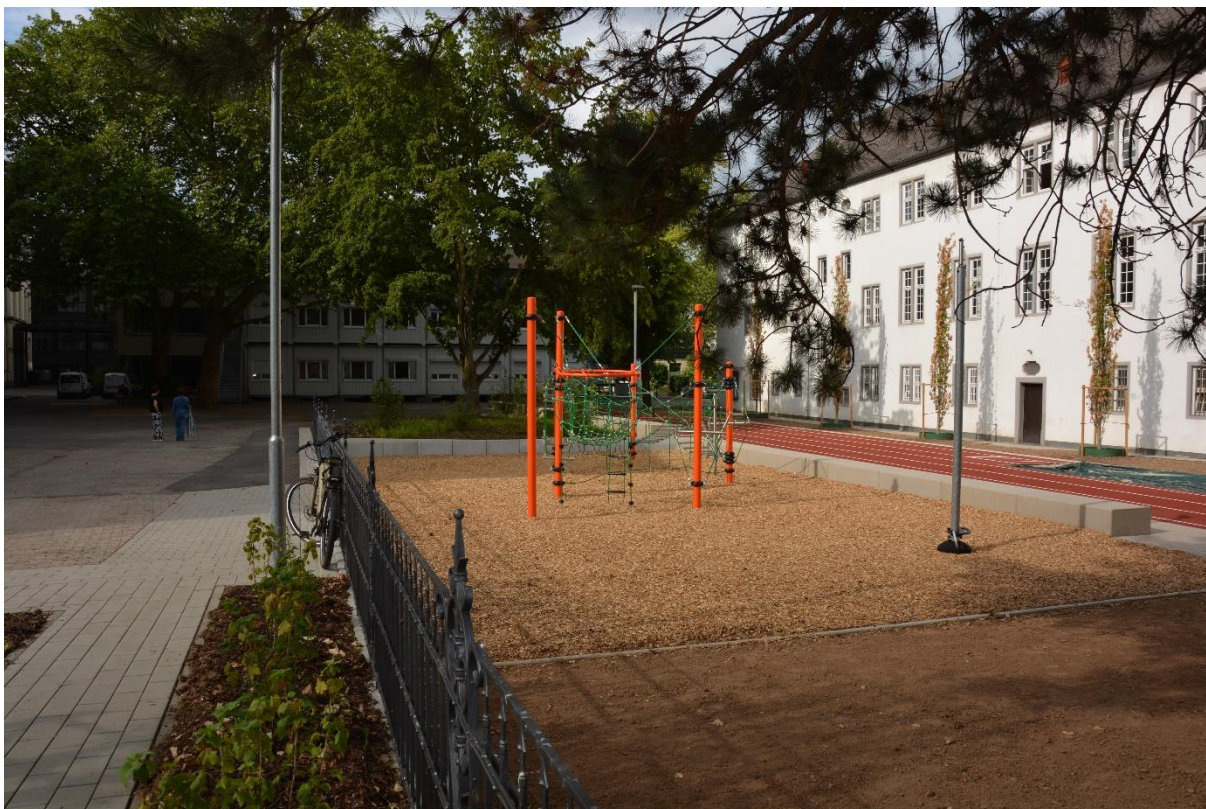


Abbildung 2 – Spielbereich, eingerahmt vom historischen Zaun, Sitzstufen, der Laufbahn und Grünflächen

Aufgestellt:

12.09.2023, ZGM
