

BUGA 2011 in Koblenz

SPIRIT
FOR
SUCCESS

Stand Baustelle Haltepunkt
Sondersitzung des Stadtrates am 17.01.2011

Verkehrsprojekte

VP3 Neubau Haltepunkt Stadtmitt



Verkehrsprojekte

VP3 Neubau Haltepunkt Stadtmitte

In der Zeit vom 17.12.2010 – 17.01.2011 wurden folgende Arbeiten ausgeführt:

- Geländerbau im gesamten Baubereich
- Herstellung des Zaunes am Gemeindezentrum
- Herstellung von Leerrohrtrassen im Mittelbahnsteig
- Die Pflasterarbeiten haben witterungsbedingt bis 10.01.11 geruht.
- Setzen der Winkelsteine an der Rampe Nord
- **Der Fertigstellungsgrad des Haltepunktes ca. 85%**
- **Der Bahnsteigbau ist bis auf Restarbeiten abgeschlossen**



15.12.2010

Verkehrsprojekte

VP3 Neubau Haltepunkt Stadtmitt




13.01.2011

17.12.2010

Verkehrsprojekte

VP3 Neubau Haltepunkt Stadtmitte

Ab dem 17.01.2011 sind folgende Arbeiten zu Ausführung vorgesehen:

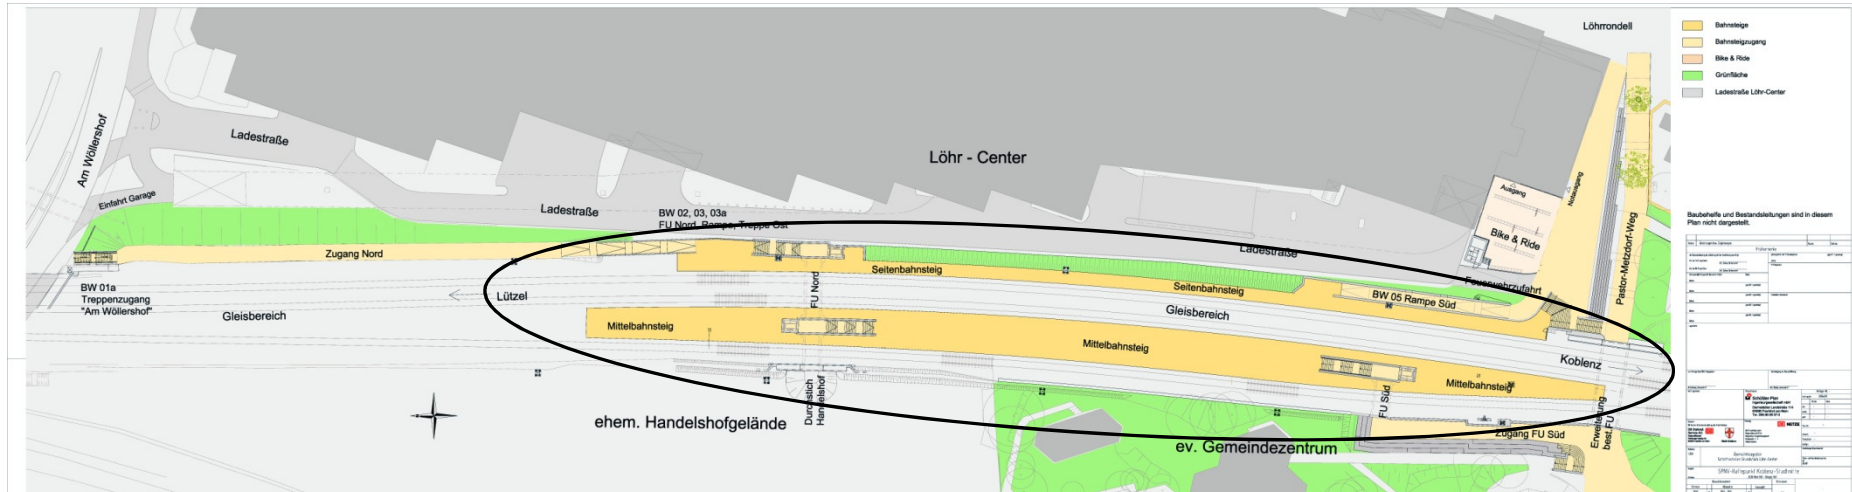


- Ausstattung der Bahnsteige (Wetterschutzhäuschen, Bänke, Fahrkartenautomaten, Beleuchtung, Beschallung)



Verkehrsprojekte

VP3 Neubau Haltepunkt Stadtmitte

Ab dem 17.01.2011 sind folgende Arbeiten zu Ausführung vorgesehen:

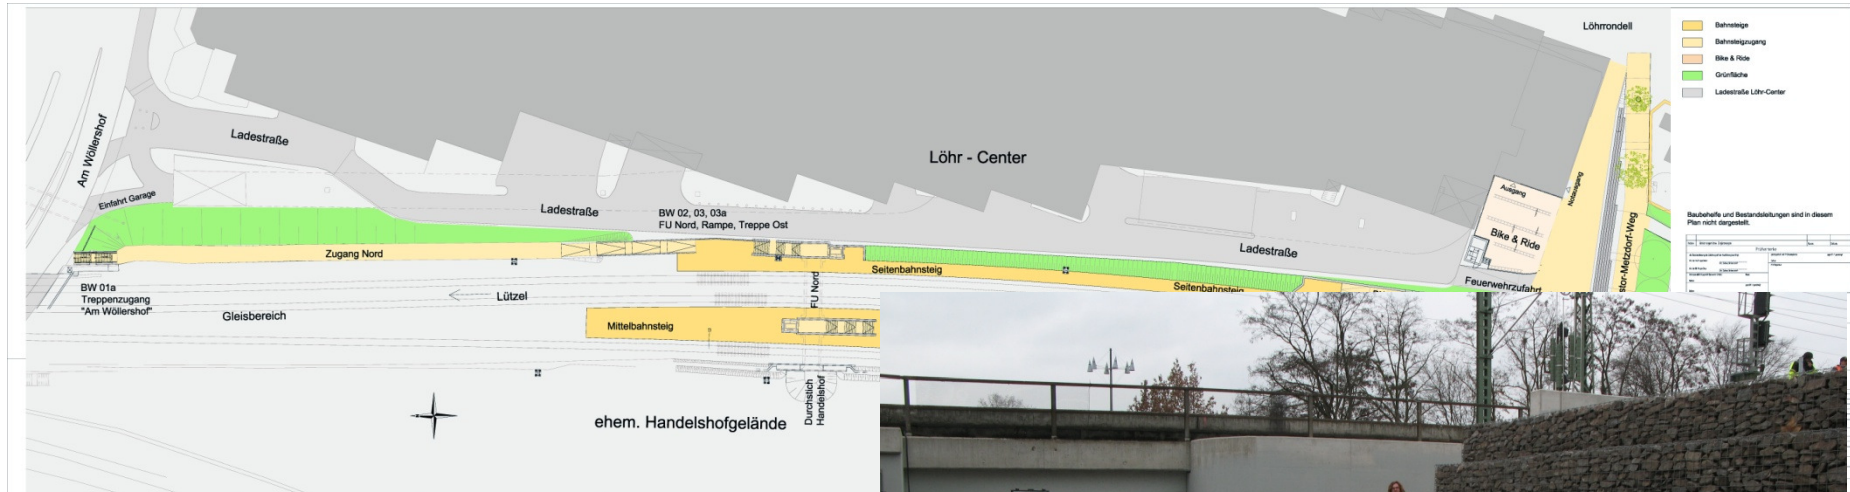


- Fertigstellung Geländerarbeiten, Pflasterarbeiten, Begrünung

Verkehrsprojekte

VP3 Neubau Haltepunkt Stadtmitte

Ab dem 17.01.2011 sind folgende Arbeiten zu Ausführung vorgesehen:

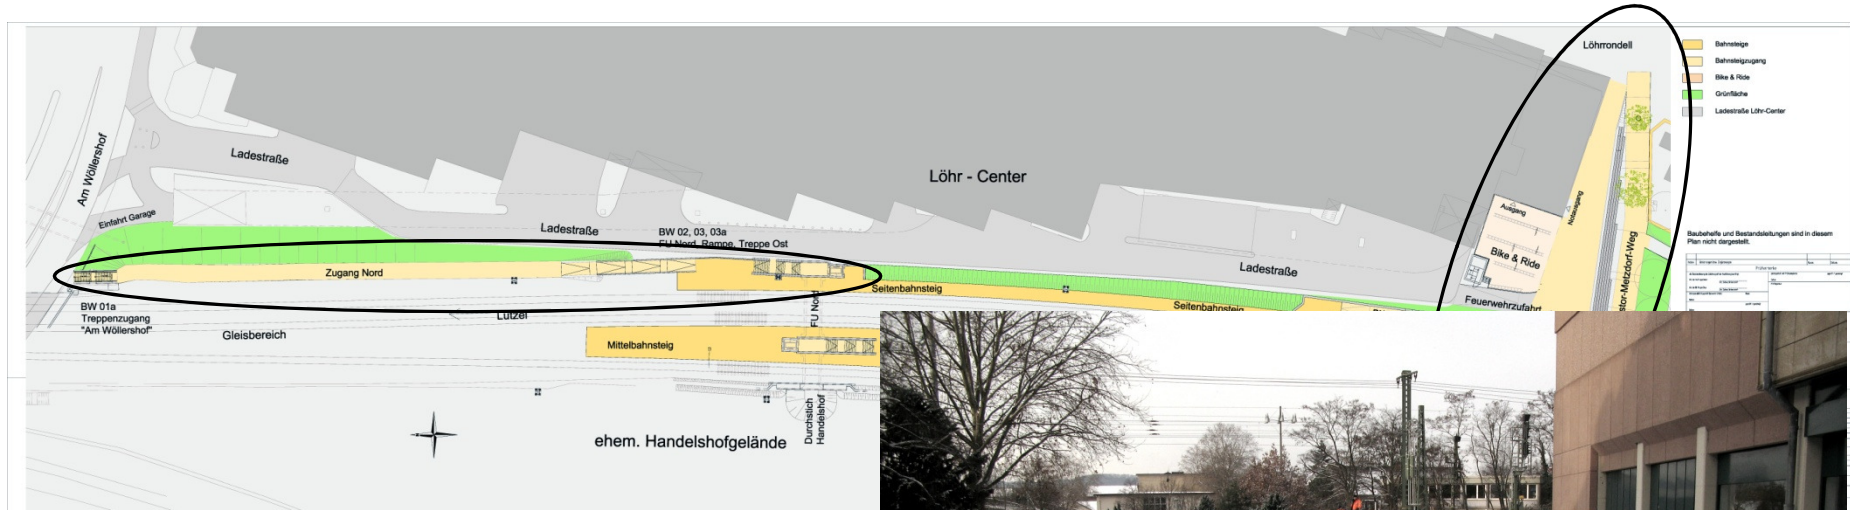


- Herstellung der städtischen Beleuchtung



Verkehrsprojekte

VP3 Neubau Haltepunkt Stadtmitte

Ab dem 17.01.2011 sind folgende Arbeiten zu Ausführung vorgesehen:

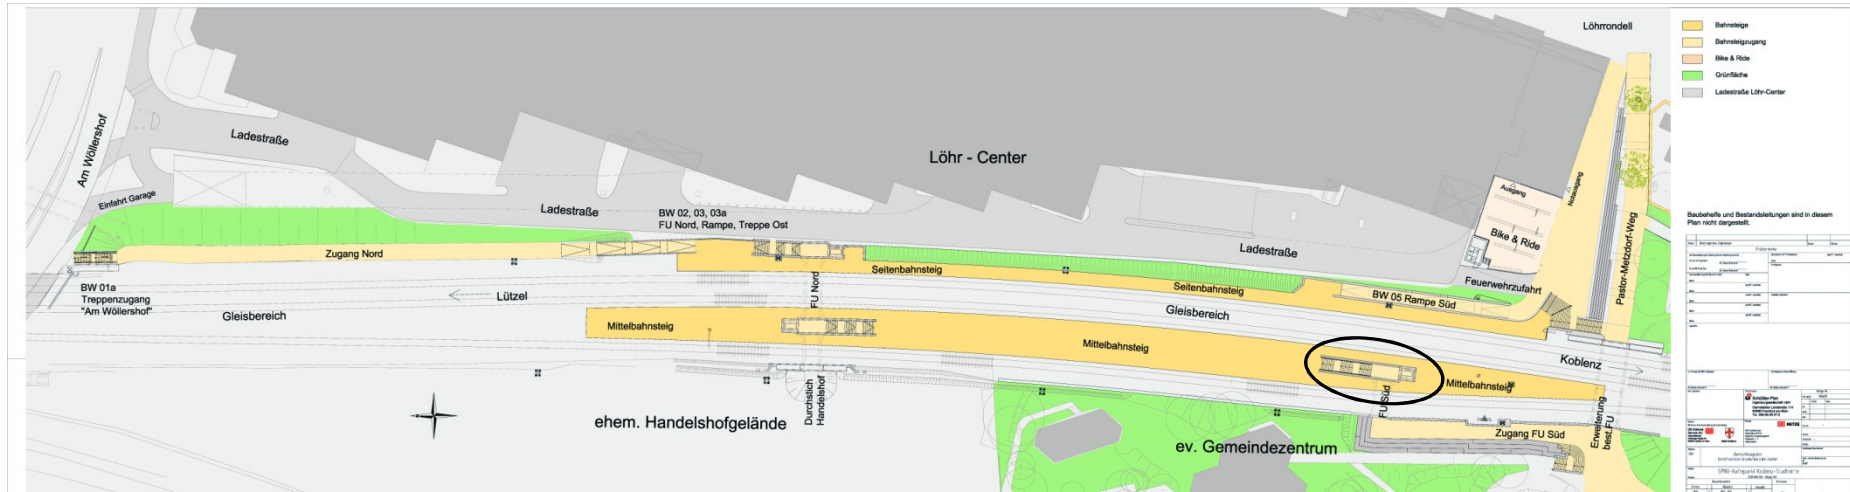


- Montage des Aufzuges



Verkehrsprojekte

VP3 Neubau Haltepunkt Stadtmitte

Ab dem 17.01.2011 sind folgende Arbeiten zu Ausführung vorgesehen:

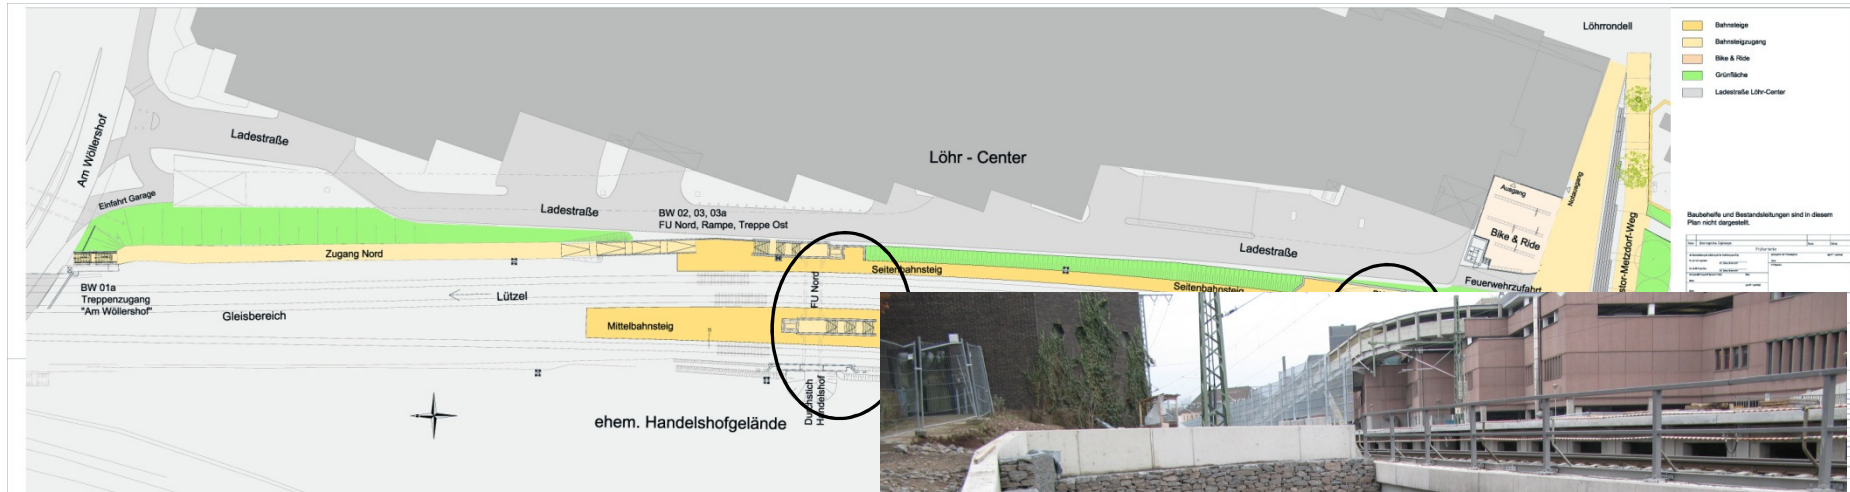


- Fertigstellung Anti-Graffiti-Schutz



Verkehrsprojekte

VP3 Neubau Haltepunkt Stadtmitte

Ab dem 17.01.2011 sind folgende Arbeiten zu Ausführung vorgesehen:

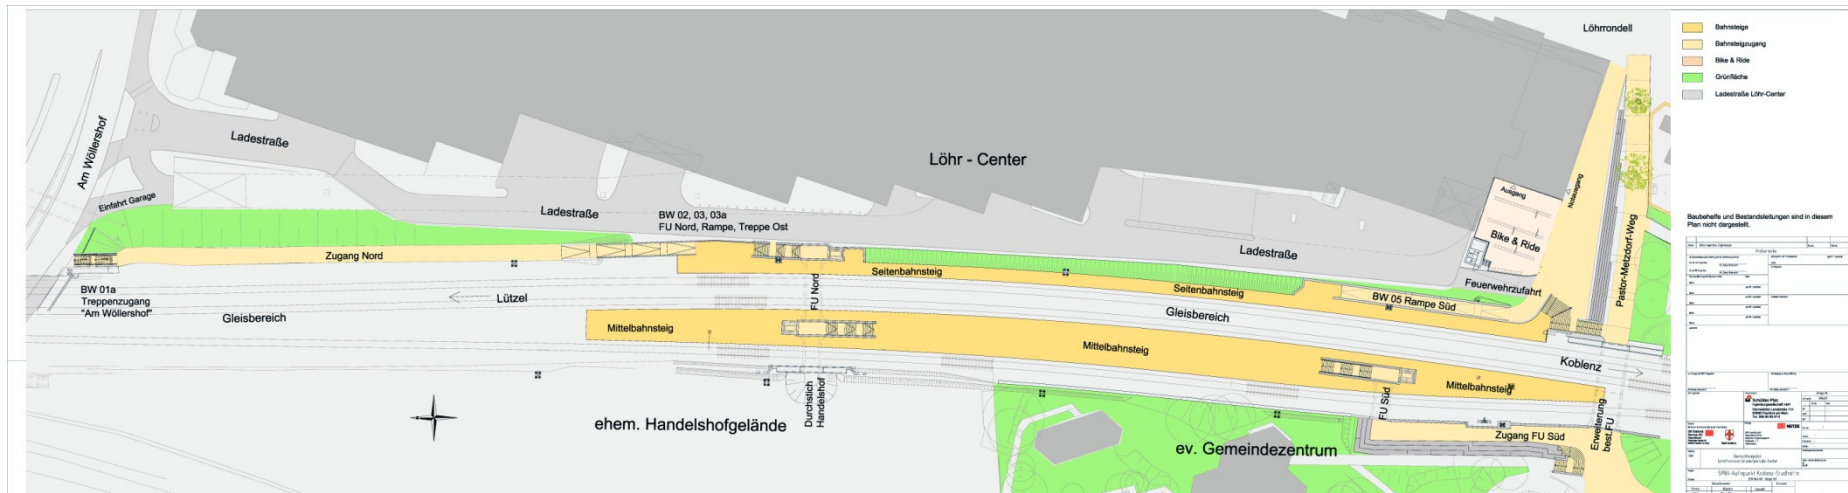

- Räumen der Baustelle, Wiederherstellung des Handelshofgeländes und der Ladestraße Löhrcenter
- Abnahmen, Inbetriebnahmen, Dokumentationen
- Mängelbeseitigung aus Abnahmen



**aktuelle Terminalschiene:
Inbetriebnahme: 07.04.2011
erster Zughalt: 13.04.2011**
