

## Vorstellung im Schulträgereausschuss 10.02.2021

### **Kostensituation:**

Haushaltsansatz:	1.251.491,00 €
Stand Beauftragung:	8.065,00 €
Stand Abrechnung:	4.914,00 €


### **Stand Planungsleistungen:**

Zur Erstellung erster Einschätzungen und Entwurfsideen wurde im Jahr 2018 ein Koblenzer Planungsbüro mit der Erstellung der Planungen beauftragt. Im Folgenden gab es verschiedene Abstimmungsgespräche mit der Schulverwaltung, dem EB 67, dem ZGM und dem Planungsbüro und erste Ideen wurden formuliert. Bedingt durch die Notwendigkeit der kompletten Neuordnung und Neuverlegung der Ver- und Entsorgungsleitungen innerhalb des Schulhofes mussten zunächst diese Planungen vorbereitet werden. Auch hierzu wurde ein Planungsbüro beauftragt und erste Vorplanungen sind erfolgt.

Nachdem die Schulverwaltung im Jahr 2019 die Notwendigkeit der Schulerweiterung in eine fünfzügige Grundschule in die Planungsgespräche einbrachte, wurde zunächst die weitere Planung des Schulhofes ausgesetzt, um zunächst die Schulerweiterung zu planen. Nach Klärung der neuen Maßnahme mit den Fördergebern ADD und SGD kann die weitere Schulhofplanung weitergeführt werden. Die Abstimmungen mit den Fördergebern dauern noch an.

### **Weitere Vorgehensweise:**

Nach Klärung der weiteren Schulentwicklung werden die Schulhofplanungen wieder aufgenommen.

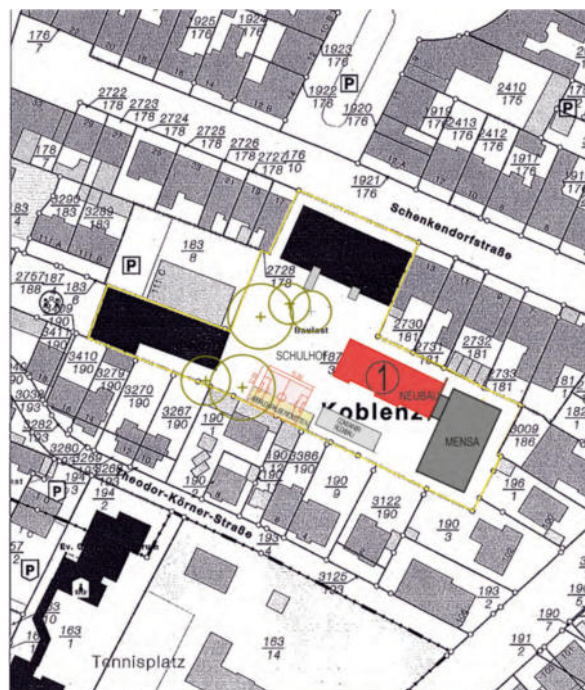

Möglicher Erweiterungsbau

Aufgestellt:  
15.01.2021 ZGM
