

Vorstellung im Schulträgersausschuss 16.11.2022

Kostensituation:

Haushaltsansatz:	350.000,00 €
Nachtrag Haushalt:	350.000,00 €
Stand Beauftragung Okt.22:	539.309,58 €
Stand Abrechnung Okt. 22:	123.572,72 €

Stand Planung:

Im Zuge der künftig zu erwartenden / prognostizierten Schülerzahlen wird der Schulstandort 2-zügig. Daraus resultiert ein Mehrbedarf an Unterrichtsräumen, Verwaltungsräumlichkeiten und des Mehrzweckraumes. Das Raumprogramm der Grundschule wurde im Vorfeld mit der ADD abgestimmt. Der Erweiterungsbau soll in Form eines zweigeschossigen Baukörpers und einen eingeschossigen Verbindungskörper, der als neuer Eingangsbereich/ Foyer und überdachte Pausenhalle fungieren. Der Erweiterungsbau ist als nicht unterkellertes Holzhybridbau mit den Abmessungen von 16,00m / 36,00 m geplant.

Die Förderantragsunterlagen, sowie der Bauantrag wurden nach erfolgter Abstimmung mit der ADD zusammengeführt und werden in der 45. KW eingereicht.

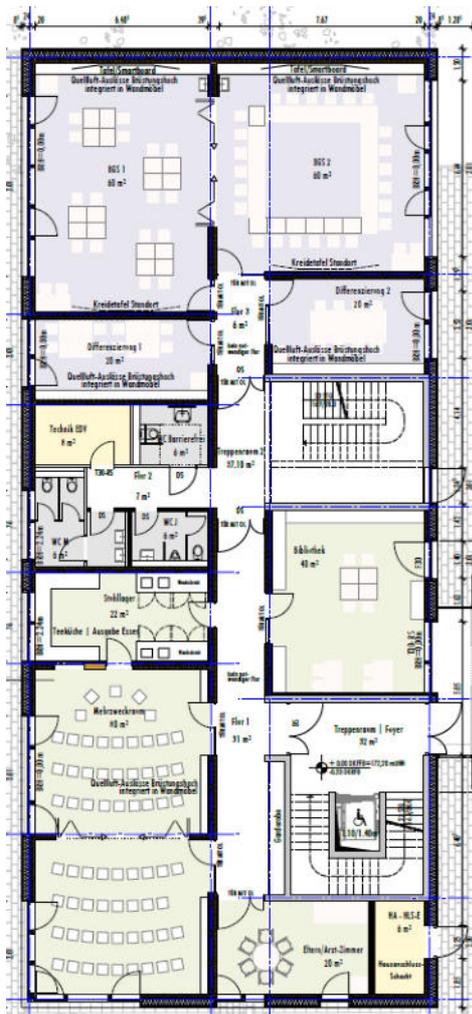


Abbildung 1: Grundriss EG

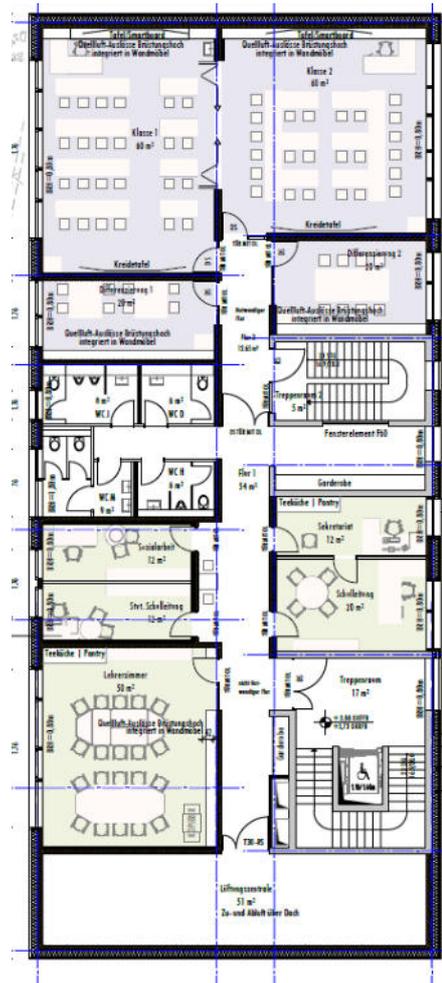


Abbildung 2: Grundriss 1F

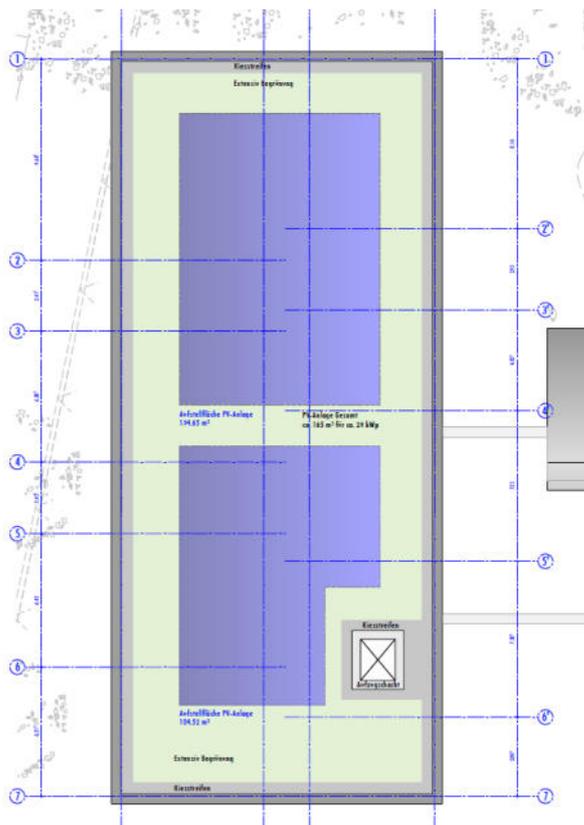


Abbildung 3: Grundriss DG

Aufgestellt:

07.11.2022 ZGM
