



# Konzept für das Mountainbiken im Stadtwald Koblenz

## Bericht für den Forstausschuss

### Umsetzung Trailgestaltung

### „Tagebuch“

Version 1.0, Stand 19.10.2021  
Für Rückfragen: [info@mtbkoblenz.de](mailto:info@mtbkoblenz.de)

#### Vorbemerkung

Das Konzept für das Mountainbiken im Stadtwald Koblenz wurde im Forstausschuss der Stadt Koblenz am 20.4.2021 beschlossen. Im Rahmen des Konzeptes ergeben sich Anforderungen an die Trailgestaltung der Mountainbike-Trails im Stadtwald. Dieses Dokument dient als Ergebnisbericht und gibt einen Überblick über den Stand der Maßnahmen.

#### Bezeichnung der Trails im Stadtwald

Die Trails im Stadtwald haben Namensbezeichnungen, die in der MTB Community verwendet werden. Es ist Tradition, dass die Trails von den jeweiligen Trailgestaltern benannt werden, teilweise gibt es mehrere Namen für einen Trail. Zur einfacheren Darstellung in Karten und für das Konzept der Meldepunkte ist eine kurze, eindeutige Bezeichnung (Nummerierung) hilfreich. Die Nummerierung folgt der Systematik *KorridornummerTrailnummer*, d. h. der im Korridor 2 (Siechhausbach) befindliche dritte Trail Eggiline / Röder erhält die Nummer 23.

Korridor	Trailname(n)	Nummer
Lay	Layerkasten / Maurermeister	11
	Layer Trail 2 (NN)	12
Siechhausbach	Sender rechts	21
	Sender Mitte	22
	Eggiline / Röder	23
	Heuweg	24
Laubach	Big Bamboo	25
	4Seasons	31
	Jumpline	32
	Mischamatsch	33
	Verbindung	34
Königsbacher	Jahntrail	35
	Rittersturz / Linus-Trail	36
	Köba	41

## Prioritätenliste zur Trailgestaltung (Paket I)

In den auf die Forstausschuss-Sitzung folgenden Abstimmungsterminen wurde eine erste Liste von Prioritäten (Paket 1) besprochen, die sukzessive umgesetzt und ergänzt wird:

- Sender rechts (Trail 21)  
Umlegung des Ausstiegs (bereits erfolgt in KW19/2021)
- Königsbacher (Trail 41)  
Umlegung des Einstiegs (bereits erfolgt in KW16/2021)  
Umlaufsperrung auf Wanderweg (unterer Trailabschnitt)
- Eggiline/Röder (Trail 23)  
Umlegung Ausstieg
- Layerkasten (Trail 11)  
Umlegung Trailabschnitt
- Linustrail/Rittersturz (Trail 36)  
Umlegung Trailabschnitt

## Prioritäten, Maßnahmen, Status Quo

1. Sender rechts (Trail 21 – Korridor Siechhausbach)  
Maßnahme: Umlegung Ausstieg  
Problematik: Der Trail endet auf der Römerstraße (Unfallgefahr).  
Lösung: Der Ausstieg des Trails wird auf den seitlichen Forstweg geführt.  
Status: Erledigt in KW 19/2021
2. Köba (Trail 41 – Korridor Königsbach)  
Maßnahme: Umlegung Einstieg  
Problematik: Die MTB kreuzen den Wanderweg am Aussichtspunkt Dommelberghütte von der Kuppe in Richtung Kuhle ungebremst.  
Lösung: Der Einstieg wird als Zubringer weiter links<sup>1</sup> angelegt, der Einstieg über die Kuhle wird geschlossen.  
Status: Erledigt in KW 16/2021
3. Eggiline / Röder (Trail 23 – Korridor Siechhausbach)  
Maßnahme: Umlegung Ausstieg  
Problematik: Die MTB fahren mit hoher Geschwindigkeit auf den Heuweg.  
Lösung: Der Ausstieg wird weiter rechts gestaltet, MTB vorher verlangsamt. Durch die Geländebeschaffenheit kann der Ausstieg nur über eine Kante erfolgen. Durch die geringere Geschwindigkeit vor dem Ausstieg sollen Wanderer für Mountainbiker (u. u.) rechtzeitig zu erkennen sein. Im nächsten Umfeld des bisherigen Ausstiegs gibt es keine flachen Abschnitte ohne Kanten.  
Status: 95% (erledigt voraussichtlich KW 45/2021 – der neue Abschnitt ist bereits gestaltet worden, es fehlt noch die Anbindung einer parallelen Linie)

---


<sup>1</sup> Orientierung links / rechts erfolgt immer in Fahrtrichtung (entlang des Trailverlaufs, üblicherweise bergab – Uphill-Trails werden explizit gekennzeichnet)

4. Layerkasten (Trail 11 – Korridor Lay)  
Maßnahme: Umlegung Trailabschnitt  
Problematik: Aufgrund des Korridorconceptes musste der Trailverlauf im unteren Abschnitt umgelegt werden.  
Lösung: Neuer Trailabschnitt „Maurermeister“ bis Wasserhäuschen  
Status: Erledigt  
Das erste Feedback aus der MTB Community zum neuen Abschnitt „Maurermeister“ war sehr positiv, allerdings gab es auch Hinweise, dass der neue Teil als anspruchsvoller wahrgenommen wird, als der alte. Dadurch entstanden Bedenken, ob der neue Teil von allen Mountainbikern angenommen wird. Deshalb wurde gemeinsam mit dem Amt 62 beschlossen, das Anlegen eines zweiten Trails im Korridor vorzuziehen, der, wo möglich, durch etwas flacheres Gelände führen soll und bewusst etwas weniger technisch angelegt werden soll. Zugleich wurden einige Stellen am Maurermeister durch die Trailgestalter entschärft.
  
5. Layer Trail 2 (Trail 12 – Korridor Lay)  
Maßnahme: Neuer Trail im Korridor  
Problematik: Der neue Abschnitt Maurermeister wurde als anspruchsvoller wahrgenommen, als der alte (siehe oben unter Punkt 4).  
Lösung: Zweiter, weniger anspruchsvoller Trail findet im Korridor Platz  
Status: 10% (derzeit noch kein Fertigstellungstermin, da auch vom Niederschlag abhängig)
  
6. Linustrail / Rittersturz (Trail 36 – Korridor Laubach)  
Maßnahme: Umlegung Trailabschnitt  
Problematik: Der Trailverlauf führt durch Buga-Ausgleichsbaumbestand, hierauf muss Rücksicht genommen werden, um Risiken zu vermeiden.  
Lösung: Der neue Trailabschnitt umgeht diesen Bereich  
Status: Erledigt
  
7. Big Bamboo Trail (Trail 25 – Korridor Siechhausbach)  
Maßnahme: Pflege Ausstieg  
Problematik: Durch starke Regenfälle ist eine tiefe Rinne entstanden, wodurch der moderat steile Ausstieg des Trails deutlich anspruchsvoller wurde. Rückmeldungen aus der MTB Community betonten die erhöhte Unfallgefahr.  
Lösung: Entschärfung der Stelle durch Trailpflege  
Status: Erledigt

## Übersicht der Maßnahmen

#	Trail	Maßnahme	Problematik	Lösung	Status	Zeit
1	Sender rechts (21)	Umlegung Ausstieg	Der Trail endet auf der Römerstraße (Unfallgefahr mit PKW).	Der Ausstieg des Trails wird auf den seitlichen Forstweg geführt.	erledigt	KW 19 2021
2	Köba (41)	Umlegung Einstieg	Bei der Anfahrt auf die Kuhle kreuzen die MTB den Wanderweg ungebremst	Der Einstieg wird als Zubringer weiter links angelegt, der Einstieg über die Kuhle wird geschlossen	erledigt	KW 16 2021
3	Eggiline / Röder (23)	Umlegung Ausstieg	Die MTB fahren mit hoher Geschwindigkeit auf den Heuweg	Der Ausstieg wird weiter rechts gestaltet, MTB vorher verlangsamt	95%	Ca. KW 45 2021
4	Layer-kasten (11)	Umlegung Trailabschnitt	Trailverlauf entspricht nicht Korridorkonzept	Neuer Trailabschnitt bis Wasserhäuschen	erledigt	Ca. KW 25 2021
5	Layer Trail 2 (12)	neuer Trailabschnitt	Maurermeister anspruchsvoller als alter Trail	Neuer Trailabschnitt im Korridor Lay in flacherem Bereich	10%	
6	Linustrail /Rittersturz (36)	Umlegung Trailabschnitt	Trailverlauf führt durch Buga-Ausgleichsbaumbestand	Der neue Trailabschnitt umgeht diesen Bereich	erledigt	Ca. KW 28 2021
7	Big Bamboo Trail (25)	Pflege Ausstieg	Durch Rinne erhöhte Unfallgefahr	Trailpflege erfolgt	erledigt	KW 33 2021

Das untenstehende Bild zeigt eine Übersicht der Orte der einzelnen Trailgestaltungsmaßnahmen:

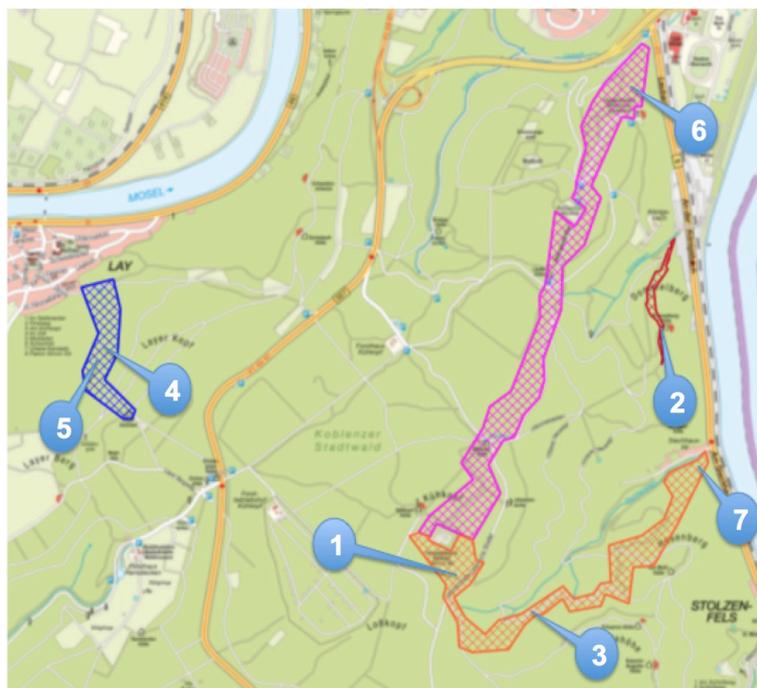

## **Ausblick**

Der Fokus des ersten Pakets von Trailgestaltungsprojekten lag auf als dringend wahrgenommenen Maßnahmen, wie z. B. die Umlegung des Layerkasten Trails (11) im Korridor Lay.

Im zweiten Maßnahmenpaket liegt der Schwerpunkt auf:

1. Trailpflege
2. Beseitigung von Stellen mit besonderem Konfliktpotential
3. Schaffung von Alternativen, um Erosion und zu weggefallenen oder nur eingeschränkt nutzbaren Trails

Im Rahmen der Trailpflege sollen Problemstellen auf den Trails erkannt und beseitigt werden (beispielsweise Rinnen wie durch Maßnahme 7 in Paket I).

Darüber hinaus sollen Stellen, die besonderes Konfliktpotential bedeuten, entschärft werden (beispielsweise durch Umlegung von Trail-Einstiegen oder -Ausstiegen, siehe Maßnahmen 1 und 2 in Paket I).

Stellenweise werden neue Trailabschnitte alte Abschnitte ersetzen oder ergänzen, um Erosion vorzubeugen. Um die Sicherheit zu erhöhen, ist geplant, unterschiedliche Niveaus besser zu berücksichtigen, indem für anspruchsvollere Trails alternative Linien angeboten werden.

Die MTB Initiative kann jedoch keine Aussagen über Schwierigkeitsgrade der Trails machen oder einen bestimmten Zustand der Trails zusichern. Sie kommuniziert mit den Trailgestaltenden, kann aber die Einhaltung des Trailgestaltungshandbuchs nicht zusichern.

Die einzelnen Maßnahmen des zweiten Paketes befinden sich derzeit in Planung.
